Betoniteollisuus ry

Safety Alert 9:
Vemon unohtuminen seinäelementistä

Vaaratilanteen kuvaus

- Seinäelementtiin oli unohtunut laittaa tönärin kiinnikkeeksi tarkoitettu vemo.
- Virheen havainnut työntekijä oli katkaissut vemosta tartuntatapit ja juottanut vemon poraamaansa reikään.
- Toisessa vastaavassa tapauksessa työntekijä oli asentanut poraamaansa reikään lyöntiankkurin, mutta jättänyt lyömättä ankkurin kiilan pohjaan.
- Molemmissa tapauksissa epäkelpo kiinnike huomattiin työmaalla ennen kuin elementtiä oli ehditty irrottaa nostorakseista.

Korjaavat toimenpiteet

- Jos seinäelementtiin on unohtunut asentaa elementin asennustyössä tarvittava vemo, virhettä ei yritetä korjata tehtaalla.
- Elementtiasentajilla on käytössään jälkiasennuskiinnikkeitä, joita voidaan käyttää puuttuvan vemon tapauksessa.

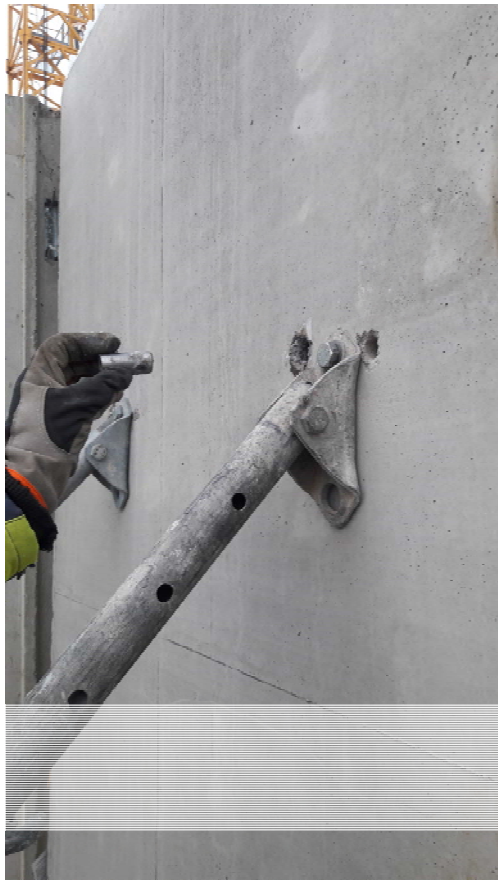

Vemo, josta tartuntatapit on katkaistu ja joka ei siirrä kiinnitysvoimia
